P R O J E K T P L A N | **AT4 Gesellschaft für Bauplanung & Management mbH - Dorsten - 02362-91230** | Status: Die 22.02.05

Nr.	Los	Gewerk / Leistung	Dauer	Anfang	Ende	zuständig	fertig
1		Vorarbeiten	2 W	Mon 19.01.04	Fre 30.01.04		100%
2		Rodungen	2 W	Mon 19.01.04	Fre 30.01.04		100%
3		Bauzeit	#######	Die 13.04.04	Fre 01.07.05		61%
4		Baubeginn	0 W	Die 13.04.04	Die 13.04.04		100%
5	02	Rohbauarbeiten	30 W?	Die 13.04.04	Fre 12.11.04		100%
6	02	Leistungen bis 06.08.04	#######	Die 13.04.04	Fre 06.08.04		100%
7	02	Bauteil A	6,4 W	Mon 09.08.04	Die 21.09.04		100%
8	02	1. OG Wände	10 t	Mon 09.08.04	Fre 20.08.04		100%
9	02	1. OG Decke	1,2 W	Mon 23.08.04	Mon 30.08.04		100%
10	02	Deckenunterstütz	2 t	Mon 23.08.04	Die 24.08.04		100%
11	02	Filigran verlegen	1 t	Mit 25.08.04	Mit 25.08.04		100%
12	02	Bewehrung/Elektr	2 t	Don 26.08.04	Fre 27.08.04		100%
13	02	Beton	1 t	Mon 30.08.04	Mon 30.08.04		100%
14	02	2. OG Wände Teil 1	9 t	Die 31.08.04	Fre 10.09.04		100%
15	02	Schalung Ringbalken	1 t	Mon 13.09.04	Mon 13.09.04		100%
16	02	Bewehrung	3 t	Die 14.09.04	Don 16.09.04		100%
17	02	Beton	2 t	Fre 17.09.04	Mon 20.09.04		100%
18	02	Ausschalen	1 t	Die 21.09.04	Die 21.09.04		100%
19	02	Beginn Dachstuhl A	0 t	Mit 22.09.04	Mit 22.09.04		100%
20	02	Bauteil B	7 W	Mon 02.08.04	Fre 17.09.04		100%
21	02	1. OG Wände	5 t	Mon 02.08.04	Fre 06.08.04		100%
22	02	1. OG Decke	10 t	Mon 09.08.04	Fre 20.08.04		100%
23	02	2. OG Wände Teil 1	10 t	Mon 23.08.04	Fre 03.09.04		100%
24	02	2. OG Wände Teil 2	4 t	Die 07.09.04	Fre 10.09.04		100%
25	02	Schalung Ringbalken	1 t	Don 09.09.04	Don 09.09.04		100%
26	02	Bewehrung	3 t	Fre 10.09.04	Die 14.09.04		100%

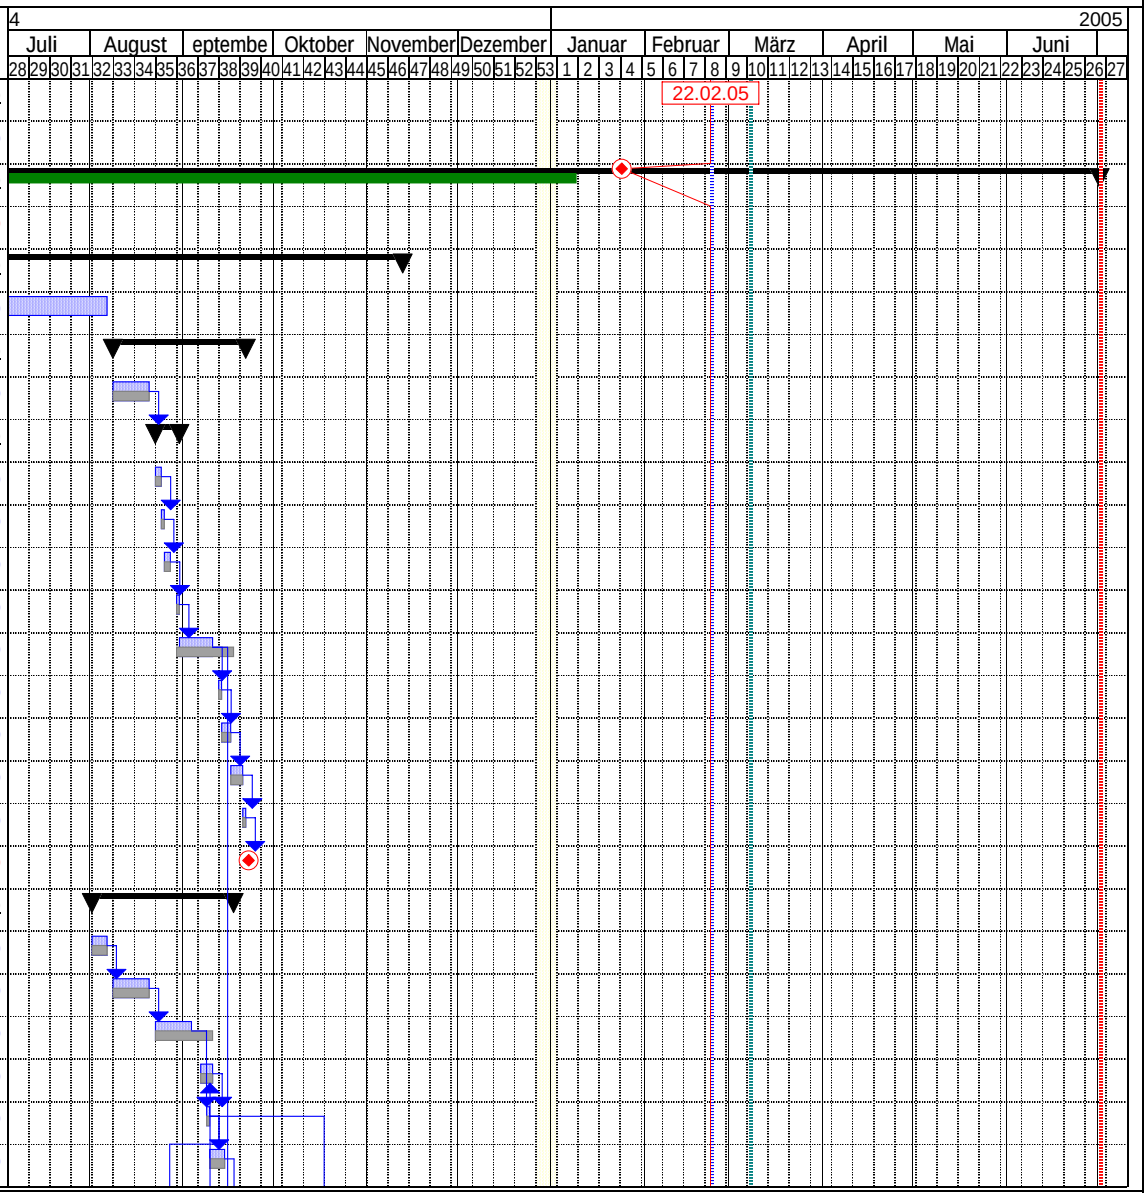

Projekt : Demo
Baustelle: Demo
Bauherr : Demo

Zeit.mpp

Vorgang | Sammelvorgang | Basisplan
Meilenstein | aktuell | Unterbrechung

(alle Zeiten zuzüglich unvorhersehbarer Ereignisse, Schlechtwetter usw.) **ausgedruckt am: Die 08.03.05** **Seite: 1**

PROJEKTPLAN **AT4 Gesellschaft für Bauplanung & Management mbH - Dorsten - 02362-91230** Status: Die 22.02.05

Nr.	Los	Gewerk / Leistung	Dauer	Anfang	Ende	zuständig	fertig
27	02	Beton	2 t	Mit 15.09.04	Don 16.09.04		100%
28	02	Ausschalen	1 t	Fre 17.09.04	Fre 17.09.04		100%
29	02	Beginn Dachstuhl B	0 t	Mon 20.09.04	Mon 20.09.04		100%
30	02	Decke Mittelteil über 1. OG	1,4 W	Fre 27.08.04	Mon 06.09.04		100%
31	02	Deckenunterstützung	2 t	Fre 27.08.04	Mon 30.08.04		100%
32	02	Filigran verlegen	2 t	Die 31.08.04	Mit 01.09.04		100%
33	02	Bewehrung/Elektro	2 t	Don 02.09.04	Fre 03.09.04		100%
34	02	Beton	1 t	Mon 06.09.04	Mon 06.09.04		100%
35	02	Decke Mittelteil über 2. OG	1,4 W	Don 16.09.04	Fre 24.09.04		100%
36	02	Deckenunterstützung	2 t	Don 16.09.04	Fre 17.09.04		100%
37	02	Filigran verlegen	2 t	Mon 20.09.04	Die 21.09.04		100%
38	02	Bewehrung/Elektro	2 t	Mit 22.09.04	Don 23.09.04		100%
39	02	Beton	1 t	Fre 24.09.04	Fre 24.09.04		100%
40	02	Bauteil C	8,8 W	Mon 26.07.04	Don 23.09.04		100%
41	02	EG Decke	10 t	Mon 26.07.04	Fre 06.08.04		100%
42	02	1. OG Wände	13 t	Mon 09.08.04	Mit 25.08.04		100%
43	02	1. OG Decke	1,2 W	Don 26.08.04	Don 02.09.04		100%
44	02	Deckenunterstütz	2 t	Don 26.08.04	Fre 27.08.04		100%
45	02	Filigran verlegen	1 t	Mon 30.08.04	Mon 30.08.04		100%
46	02	Bewehrung/Elektr	2 t	Die 31.08.04	Mit 01.09.04		100%
47	02	Beton	1 t	Don 02.09.04	Don 02.09.04		100%
48	02	2. OG Wände	6 t	Fre 03.09.04	Fre 10.09.04		100%
49	02	2. OG Wände Teil 2	6 t	Don 09.09.04	Don 16.09.04		100%
50	02	Schalung Ringbalken	3 t	Mit 15.09.04	Fre 17.09.04		100%
51	02	Bewehrung	2 t	Mon 20.09.04	Die 21.09.04		100%
52	02	Beton	1 t	Mit 22.09.04	Mit 22.09.04		100%

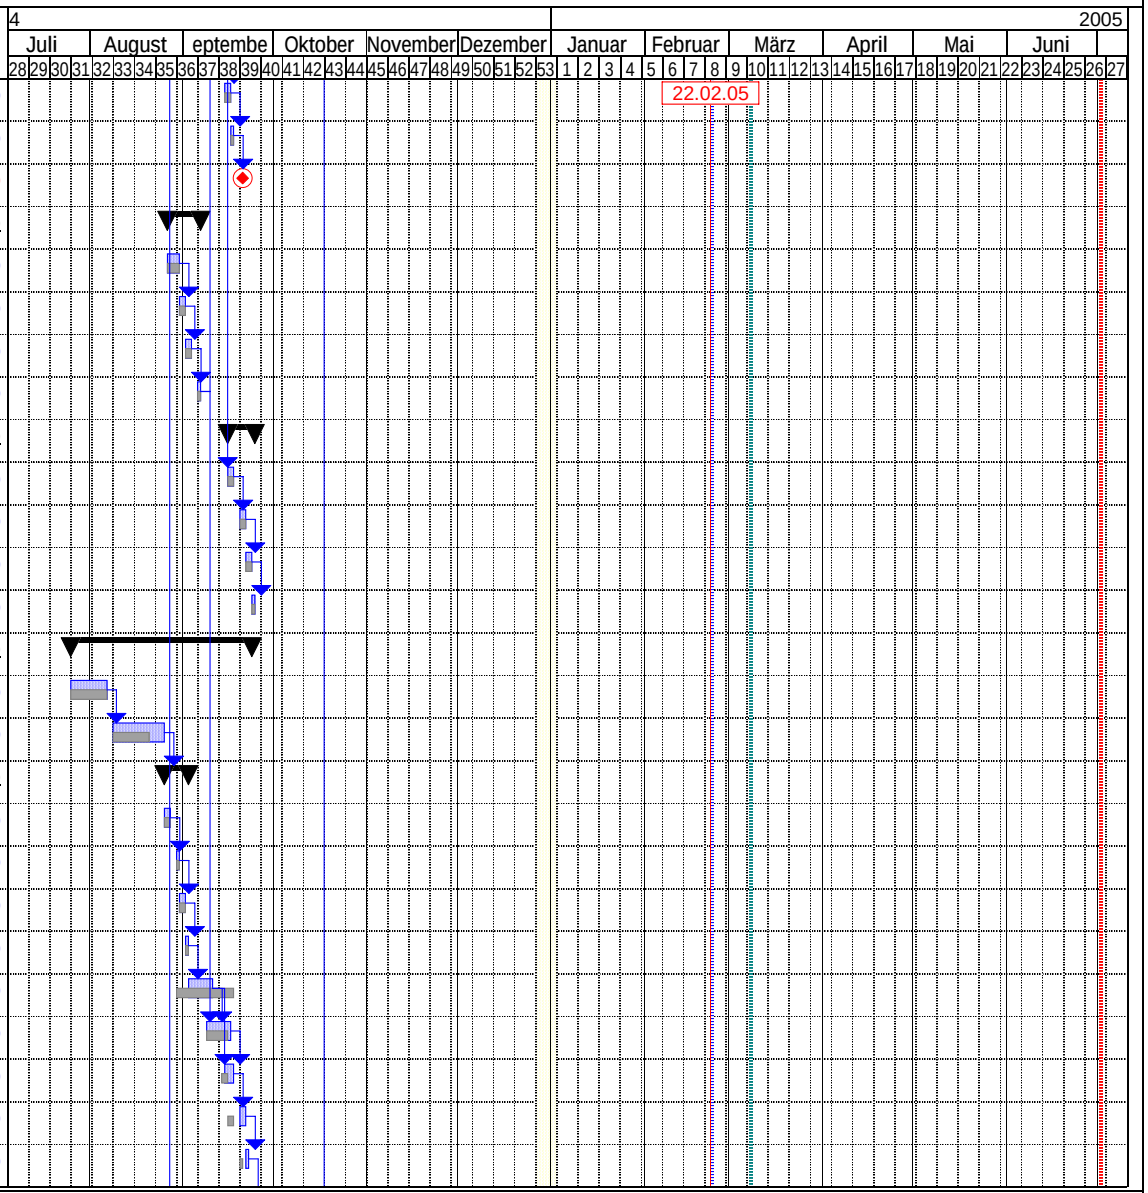

Projekt : Demo
Baustelle: Demo
Bauherr : Demo

Zeit.mpp

Vorgang | Sammelvorgang | Basisplan
Meilenstein | aktuell | Unterbrechung

(alle Zeiten zuzüglich unvorhersehbarer Ereignisse, Schlechtwetter usw.) **ausgedruckt am: Die 08.03.05** **Seite: 2**

PROJEKTPLAN **AT4 Gesellschaft für Bauplanung & Management mbH - Dorsten - 02362-91230** Status: Die 22.02.05

Nr.	Los	Gewerk / Leistung	Dauer	Anfang	Ende	zuständig	fertig
53	02	Ausschalen	1 t	Don 23.09.04	Don 23.09.04		100%
54	02	Beginn Dachstuhl c	0 t	Fre 24.09.04	Fre 24.09.04		100%
55	02	Bauteil D	7,2 W	Mon 09.08.04	Mon 27.09.04		100%
56	02	1. OG Wände	16 t	Mon 09.08.04	Mon 30.08.04		100%
57	02	1. OG Decke	1,8 W	Die 31.08.04	Fre 10.09.04		100%
58	02	Deckenunterstütz	2 t	Die 31.08.04	Mit 01.09.04		100%
59	02	Filigran verlegen	4 t	Don 02.09.04	Die 07.09.04		100%
60	02	Bewehrung/Elektr	2 t	Mit 08.09.04	Don 09.09.04		100%
61	02	Beton	1 t	Fre 10.09.04	Fre 10.09.04		100%
62	02	2. OG Wände	8 t	Mon 13.09.04	Mit 22.09.04		100%
63	02	Schalung Ringbalken	1 t	Mon 20.09.04	Mon 20.09.04		100%
64	02	Bewehrung	2 t	Die 21.09.04	Mit 22.09.04		100%
65	02	Beton	2 t	Don 23.09.04	Fre 24.09.04		100%
66	02	Ausschalen	1 t	Mon 27.09.04	Mon 27.09.04		100%
67	02	Beginn Dachstuhl D	0 t	Die 28.09.04	Die 28.09.04		100%
68	02	Restarbeiten	54 t	Mon 30.08.04	Fre 12.11.04		100%
69		Fassade/Fenster/Dach	#######	Fre 03.09.04	Die 05.04.05		87%
70	04	Fassadengerüste Übernahm	2 W	Fre 03.09.04	Don 16.09.04		100%
71	04	Fassadengerüste Abbau	5 W	Mon 13.12.04	Die 25.01.05		85%
72	10	Zimmererarbeiten	3 W?	Mon 27.09.04	Fre 15.10.04		100%
73	10	Dachstuhl	2 W?	Mon 27.09.04	Fre 08.10.04		100%
74	10	Verschalung	2,4 W	Don 30.09.04	Fre 15.10.04		100%
75		Richtfest	0 W	Fre 15.10.04	Fre 15.10.04		100%
76	11	Dachdeckerarbeiten	12,4 W	Mon 11.10.04	Fre 14.01.05		99%
77	11	geneigte Dächer	5 W	Mon 11.10.04	Die 16.11.04		100%
78	11	Abdeckprofile	2 W	Mon 11.10.04	Mon 25.10.04		100%

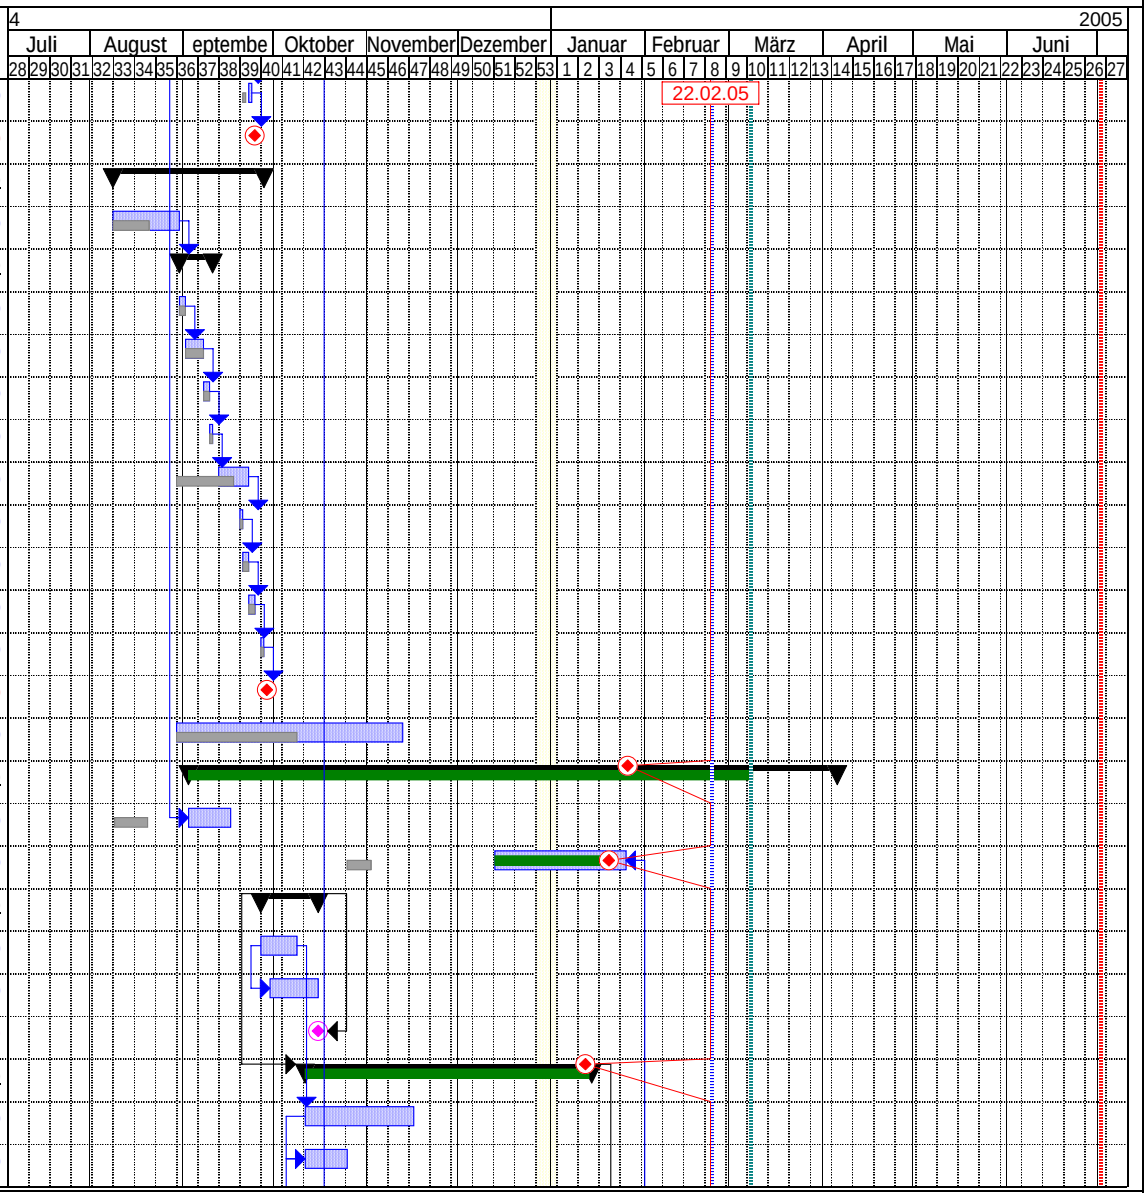

Projekt : Demo
Baustelle: Demo
Bauherr : Demo

Zeit.mpp

Vorgang — Sammelvorgang — Basisplan
Meilenstein — aktuell — Unterbrechung

(alle Zeiten zuzüglich unvorhersehbarer Ereignisse, Schlechtwetter usw.) **ausgedruckt am: Die 08.03.05** **Seite: 3**

P R O J E K T P L A N | **AT4 Gesellschaft für Bauplanung & Management mbH - Dorsten - 02362-91230** | Status: Die 22.02.05

Nr.	Los	Gewerk / Leistung	Dauer	Anfang	Ende	zuständig	fertig
79	11	senkrechte Flächen	12 W	Mon 11.10.04	Mit 12.01.05		100%
80	11	Flachdächer	8,4 W	Mon 25.10.04	Don 23.12.04		100%
81	11	Restarbeiten	3 W	Don 16.12.04	Fre 14.01.05		85%
82	13	Schlosserarbeiten außen	23,6 W	Mon 11.10.04	Die 05.04.05		60%
83	13	Befestigungswinkel	3 W	Mon 11.10.04	Fre 29.10.04		100%
84	13	Absturzsicherungen	6 W	Die 30.11.04	Die 18.01.05		90%
85	13	Fluchttreppen	12 W	Mon 10.01.05	Die 05.04.05		35%
86	17	Fensteranlagen PVC	4 W	Mon 18.10.04	Mon 15.11.04		100%
87	15	Fensteranlagen ALU	1,8 W	Mon 13.12.04	Don 23.12.04		90%
88	56	Wärmedämmputz	14 W	Mon 11.10.04	Die 25.01.05		95%
89		Restarbeiten	4 W	Mit 12.01.05	Die 08.02.05		80%
90		Technik (TGA)	30,8 W	Mon 04.10.04	Mon 23.05.05		62%
91	81	Elektro	16 W	Mon 18.10.04	Die 15.02.05		65%
92	82	Nachrichtentechnik	16 W	Mon 18.10.04	Die 15.02.05		65%
93	83	Blitzschutz	4 W	Don 25.11.04	Don 23.12.04		80%
94	91	Sanitär	17 W	Mon 04.10.04	Die 08.02.05		75%
95	92	Heizung	17 W	Mon 04.10.04	Die 08.02.05		75%
96	93	Lüftung	14 W	Die 02.11.04	Die 15.02.05		75%
97		Zentralen, Montagen usw.	12 W	Mit 19.01.05	Don 14.04.05		30%
98		TGA-Endmontage	6,2 W	Mit 06.04.05	Mon 23.05.05		0%
99		Innenausbau	32,8 W	Fre 24.09.04	Fre 27.05.05		43%
100	x	Winterbaubeheizung	11,6 W	Die 04.01.05	Don 24.03.05		62%
101	06	Innenputz	12 W	Mon 06.12.04	Mon 07.03.05		79%
102	13	Schlosserarbeiten innen	2 W	Mon 21.03.05	Die 05.04.05		0%
103	20	Fliesenarbeiten	7,8 W	Mon 24.01.05	Don 17.03.05		15%
104	11	Abdichtung Böden N	1 W	Mon 03.01.05	Fre 07.01.05		0%

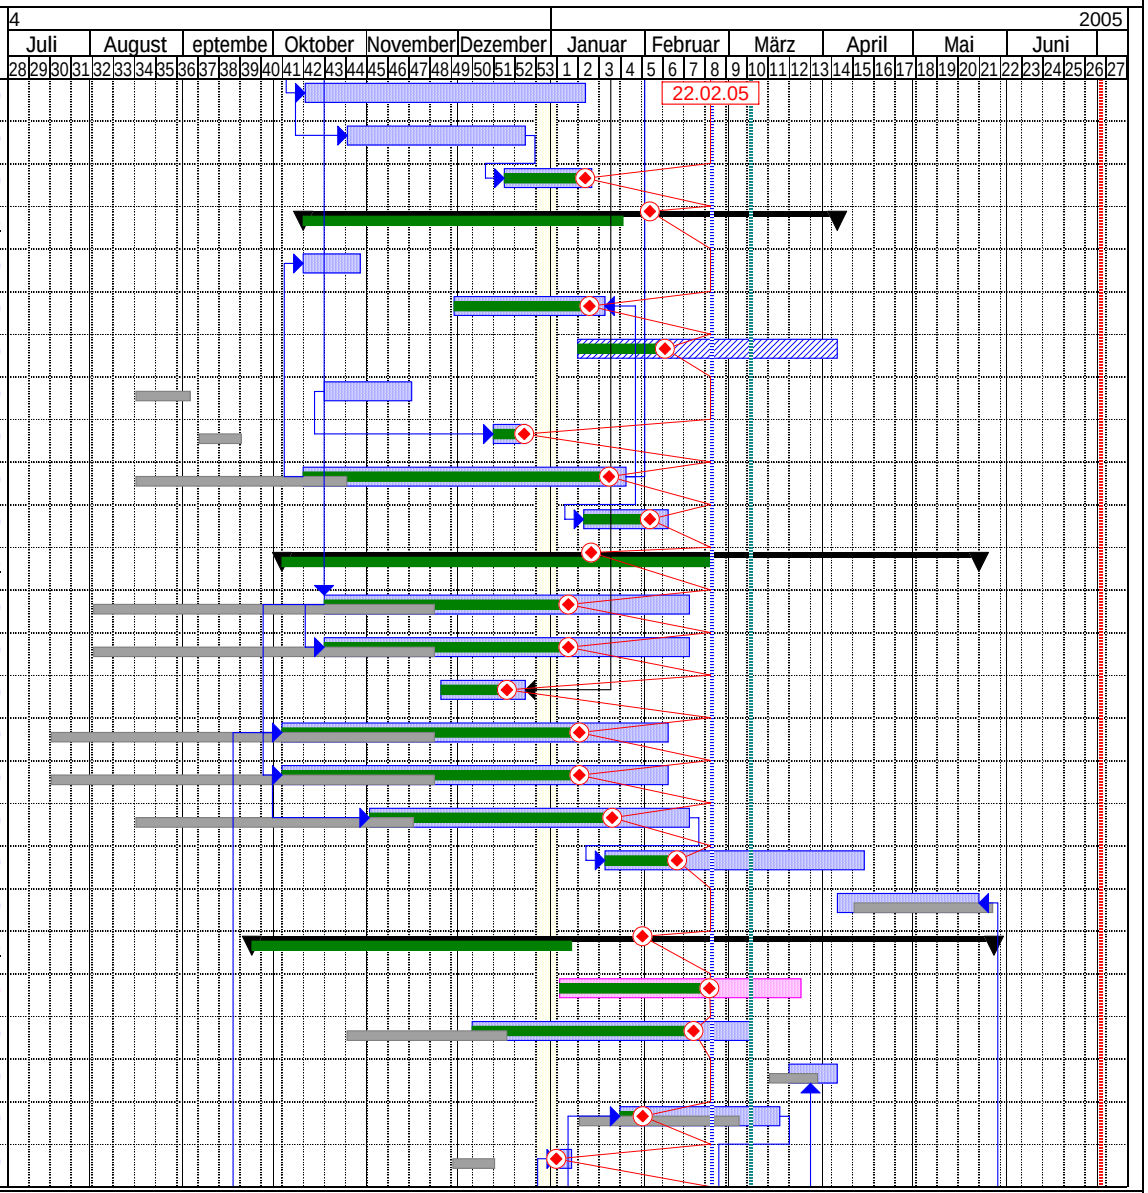

Projekt : Demo
Baustelle: Demo
Bauherr : Demo

Zeit.mpp

Vorgang | Sammelvorgang | Basisplan
Meilenstein | aktuell | Unterbrechung

(alle Zeiten zuzüglich unvorhersehbarer Ereignisse, Schlechtwetter usw.) **ausgedruckt am: Die 08.03.05** **Seite: 4**

P R O J E K T P L A N | **AT4 Gesellschaft für Bauplanung & Management mbH - Dorsten - 02362-91230** | Status: Die 22.02.05

Nr.	Los	Gewerk / Leistung	Dauer	Anfang	Ende	zuständig	fertig
105	11	Abdichtung Böden S	1 W	Mon 31.01.05	Fre 04.02.05		0%
106	21	Werkstein	3 W	Fre 04.03.05	Don 24.03.05		0%
107	30	Estrich Nord	4 W	Mon 10.01.05	Fre 04.02.05		35%
108	30	Estrich Süd	3 W	Mon 07.02.05	Fre 25.02.05		35%
109	30	Oberboden	8 W	Mon 28.02.05	Die 26.04.05		0%
110	40	Trockenbau (GK) Wände	22 W	Fre 24.09.04	Mon 07.03.05		65%
111	40	Trockenbau (GK) Decken	10 W	Mon 22.11.04	Mon 07.02.05		70%
112	50	Zargen Mauerwerk	2 W	Mit 08.12.04	Die 21.12.04		100%
113	50	Zargen GK	0 W	Mit 10.11.04	Mit 10.11.04		100%
114	50	Innentüren	2,6 W	Mit 20.04.05	Mon 09.05.05		0%
115	55	Malerarbeiten	13 W	Mon 21.02.05	Fre 27.05.05		4%
116		Sonstiges	15,8 W	Die 01.03.05	Fre 24.06.05		0%
117	60	Aufzugsanlagen Vormontage	4 W	Die 01.03.05	Mit 30.03.05		0%
118	60	Aufzugsanlagen Endmontag	4 W	Mon 14.03.05	Die 12.04.05		0%
119	96	Küche	4 W	Mon 04.04.05	Fre 29.04.05		0%
120	96	Wäscherei	4 W	Mon 04.04.05	Fre 29.04.05		0%
121	72	Schreinerarbeiten	4 W	Mit 27.04.05	Fre 27.05.05		0%
122	72	Einrichtung	4 W	Mit 11.05.05	Don 09.06.05		0%
123	78	Grundreinigung	3 W	Mit 01.06.05	Die 21.06.05		0%
124		Mängelbeseitigung	4 W	Die 24.05.05	Die 21.06.05		0%
125	70	Außenanlagen	15 W	Mon 07.03.05	Fre 24.06.05		0%
126		Inbetriebnahme	0 W	Fre 01.07.05	Fre 01.07.05		0%

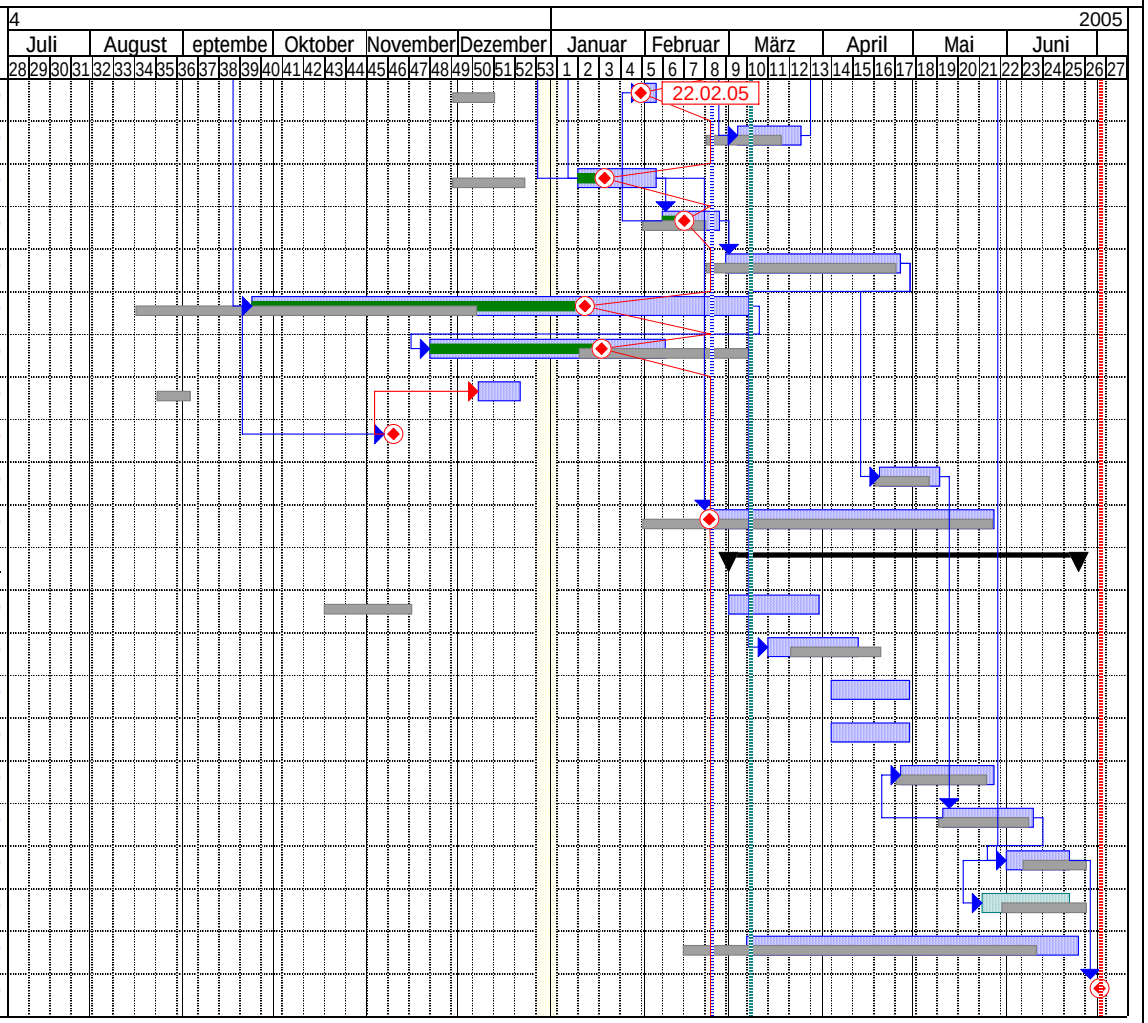

Projekt : Demo
Baustelle: Demo
Bauherr : Demo

Zeit.mpp

Vorgang | Sammelvorgang | Basisplan
Meilenstein | aktuell | Unterbrechung

(alle Zeiten zuzüglich unvorhersehbarer Ereignisse, Schlechtwetter usw.) **ausgedruckt am: Die 08.03.05** **Seite: 5**
